

Autoridad del Canal de Panamá

Informe Trimestral
Avance de los Contratos del
Proyecto Puentes sobre el
Canal en el Atlántico

30 de junio de 2011



CANAL DE PANAMÁ

Informe Trimestral

Avance de los Contratos del Proyecto Puente sobre el Canal en el Atlántico

Este informe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presenta un resumen del estatus de las contrataciones correspondientes al proyecto del Puente sobre el Canal en el Atlántico al 30 de junio de 2011, que de conformidad con lo establecido en la Ley 28 del 17 de julio de 2006, su construcción deberá iniciar, a más tardar, inmediatamente después de concluido el tercer juego de esclusas y cuyo costo deberá ser cubierto por la ACP. En este documento se resaltan los avances de las contrataciones entre los meses de abril y junio de 2011.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un puente vehicular doble atirantado de concreto y sus accesos, con una longitud total aproximada de 4,990 metros y cuatro carriles, ubicado sobre el Canal en el Atlántico, Provincia de Colón.

Contempla la conexión de la aproximación Oeste del puente con la carretera existente hacia la Costa Abajo de Colón e incluye un puente sobre el río Chagres, aguas abajo del vertedero de Gatún.

Fechas Relevantes

Disponibilidad de fondos¹: diciembre de 2010.

Inicio del diseño: 2 de junio de 2011.

Inicio proyectado de la construcción: julio de 2012.

Año proyectado de terminación: 2015.


Monto de Contratos Adjudicados

Monto total al 30 de junio de 2011: B/. 6,496,598.53.

¹ Este proyecto no forma parte del Programa de Ampliación por lo que su costo será cubierto bajo el Programa Regular de Inversiones de la ACP.

Cronograma Puente sobre el Canal en el Atlántico

30 de junio de 2011

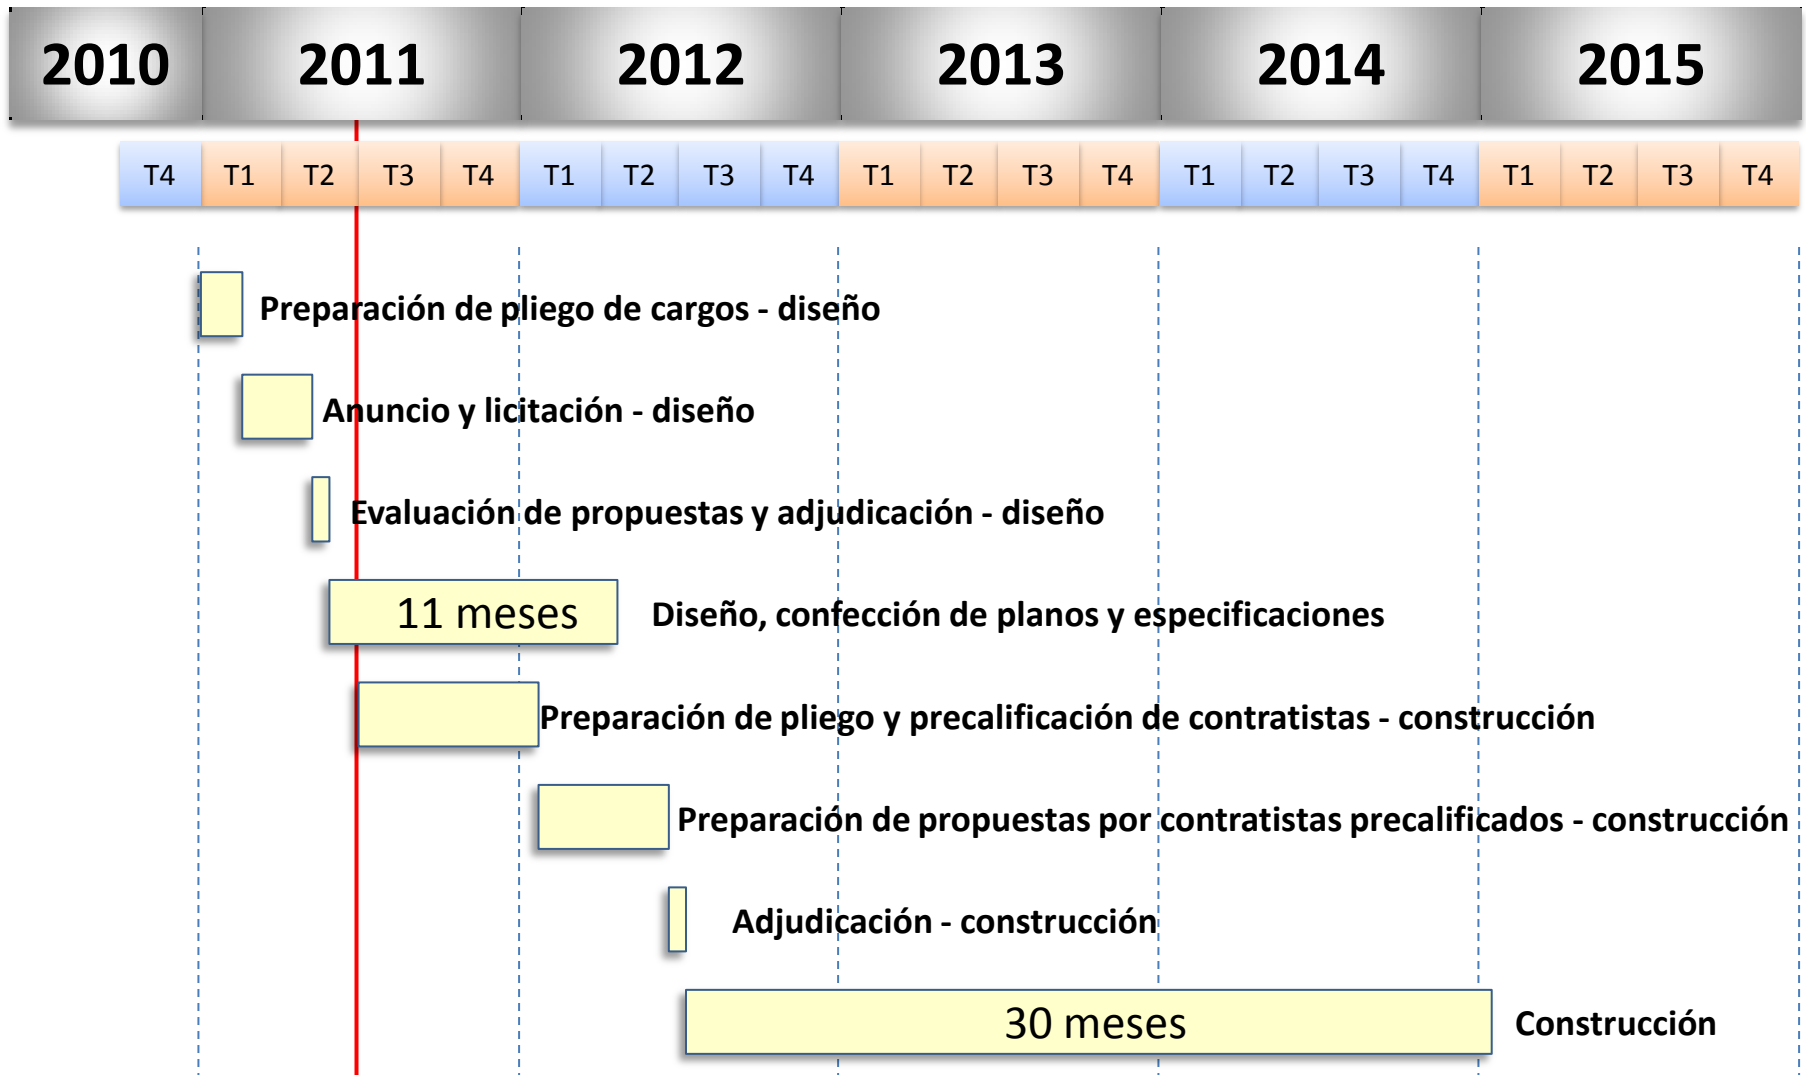

Resumen de licitaciones en proceso de contratación, órdenes de trabajo emitidas y contratos adjudicados

Actualizado al jueves, 30 de junio de 2011

Autoridad del Canal de Panamá

Contratos adjudicados en ejecución										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos	
247815	Servicios de ingeniería para el diseño final de un puente sobre el Canal en el Atlántico	CCCC-LBG CONSORTIUM	6,496,598.53	6,496,598.53	0.00	0.00	02-Jun-11	02-Jun-11	27-Abr-12	
Total de contratos adjudicados en ejecución			6,496,598.53	6,496,598.53	0.00	0.00				
Subtotal de contratos			6,496,598.53	6,496,598.53	0.00	0.00				
Total de contratos antes de intereses y descuentos			6,496,598.53	6,496,598.53	0.00	0.00				
Total de descuento por pronto pago			0.00	0.00	0.00	0.00				
Total de intereses			0.00	0.00	0.00	0.00				
Total de contratos			6,496,598.53	6,496,598.53	0.00	0.00				

Contratos Adjudicados en Ejecución

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de junio de 2011

Servicios de ingeniería para el diseño final de un puente sobre el Canal en el Atlántico

Estatus:	En Ejecución
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	247815
Fecha de Adjudicación:	02/Jun/2011
Monto del Contrato:	B/. 6,496,598.53
Gastos a la Fecha:	B/. 0.00
Fecha de Inicio:	02/Jun/2011
Conclusión de Trabajos:	27/Abr/2012 Est.
Contratista:	CCCC-LBG CONSORTIUM



Descripción de los Trabajos

El trabajo básico consiste en el diseño de un puente atirantado de concreto y de vano largo sobre el Canal de Panamá, en el sector Atlántico, con todos los sistemas y anexos que se requieran para hacer un trabajo completo; y el diseño de los viaductos de acceso al puente y carreteras en ambos lados del Canal. Se incluye también como trabajo opcional, el diseño de una carretera de acceso al oeste del puente, incluyendo un nuevo puente sobre el río Chagres, con todos los sistemas y anexos que sean necesarios para hacer un trabajo completo. Para ambos trabajos, el básico y el opcional, el contratista deberá diseñar todo el trabajo de nivelación y pavimentación de carreteras, otros puentes menores requeridos en el trazado final de los viaductos de acceso al puente y carreteras, cruces para fauna, drenajes, sistemas de iluminación, servicios públicos, sistemas de administración de tráfico y facilidades peatonales. Se requiere realizar las investigaciones geotécnicas que sean necesarias para completar el diseño final. Adicionalmente, los trabajos incluyen servicios de ingeniería geotécnica, las pruebas de laboratorio necesarias, levantamientos topográficos y confección de planos, consideraciones estéticas, diseño arquitectónico de corredores, especificaciones finales de construcción y el costo estimado de construcción, la actualización del estudio de impacto ambiental (EsIA) que fue preparado para el diseño conceptual del puente y la preparación de un estudio de impacto ambiental para la carretera oeste y el puente sobre el río Chagres.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado el 2 de junio de 2011 a CCCC-LBG Consortium, consorcio conformado por China Communications Construction Company y Louis Berger Group. La adjudicación incluye tanto el trabajo básico como el trabajo opcional. El contratista tiene 330 días calendarios para la ejecución de los trabajos, por lo que la fecha contractual de finalización es el 27 de abril de 2012.

El 17 de junio de 2011 se realizó la reunión de inicio del contrato y el contratista ha enviado el cronograma de trabajo inicial y las propuestas preliminares para el acceso oeste.

